

Laboratorio 4

Settimana dello

studente

I.T.C.G. "Michelangelo Buonarroti"

Frascati (RM), 27 marzo 2014

Responsabile scientifico: Francesca Tovenà

Gruppo di lavoro : Paola Faggiani, Maria Antonietta Restaino, Tamara Battisti

MILESTONES

- **Milestone 1:** SONDAGGIO PROGETTATO E PROPOSTO AGLI STUDENTI
- **Milestone 2:** SONDAGGIO EFFETTUATO E RISULTATI RACCOLTI


Deliverable 1: Sondaggio

ID	ATTIVITA' O TASK (ELENCA DI SEGUITO)	DUR ATA DEL TAS K	TASK PRECED ENTE
1.1	Attività: progettazione sondaggio		
1.1.1	Task: Raccolta informazioni dalle edizioni precedenti	2	-
1.1.2	Task: Formulazione delle proposte	2	1.1.1
1.1.3	Task: Scelta dello strumento web per la realizzazione e pubblicazione del sondaggio	1	-
1.2	Attività: Pubblicazione sondaggio su web		
1.2.1	Task: Pubblicazione sondaggio su web	1	1.1.2, 1.1.3
1.2.2	Task: Invitare gli studenti al sondaggio	7	1.2.1
M1	Milestone 1		

WBS Sondaggio: M1

ID	ATTIVITA' O TASK (ELENCA DI SEGUITO)	DURA TA DEL TASK	TASK PRECEDE NTE
2.1	Attività: Chiusura sondaggio e raccolta dati		
2.1.1	Task: Chiusura sondaggio e scarico dati	1	1.2.2
2.1.2	Task: Analisi dei dati (input per la pianificazione dei corsi)		2.1.1
M2	Milestone 2		


WBS Sondaggio: M2

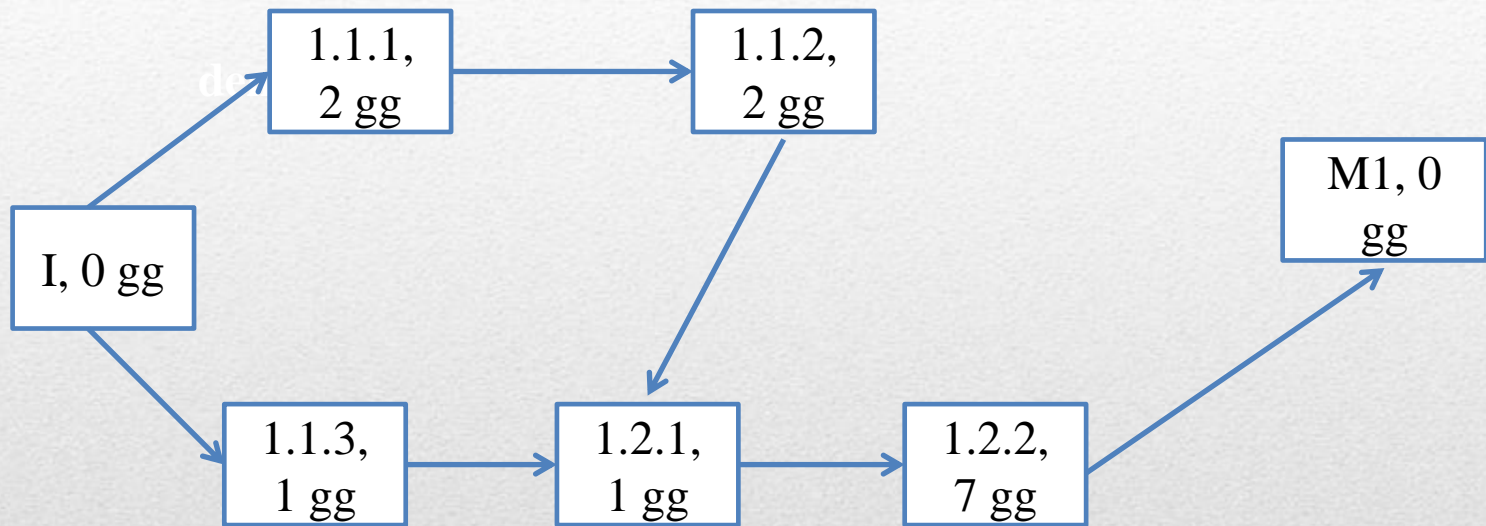

Il reticolo di progetto: M1

Fine_min = Inizio_min + durata_task


Inizio_min = Fine_min (task precedente)

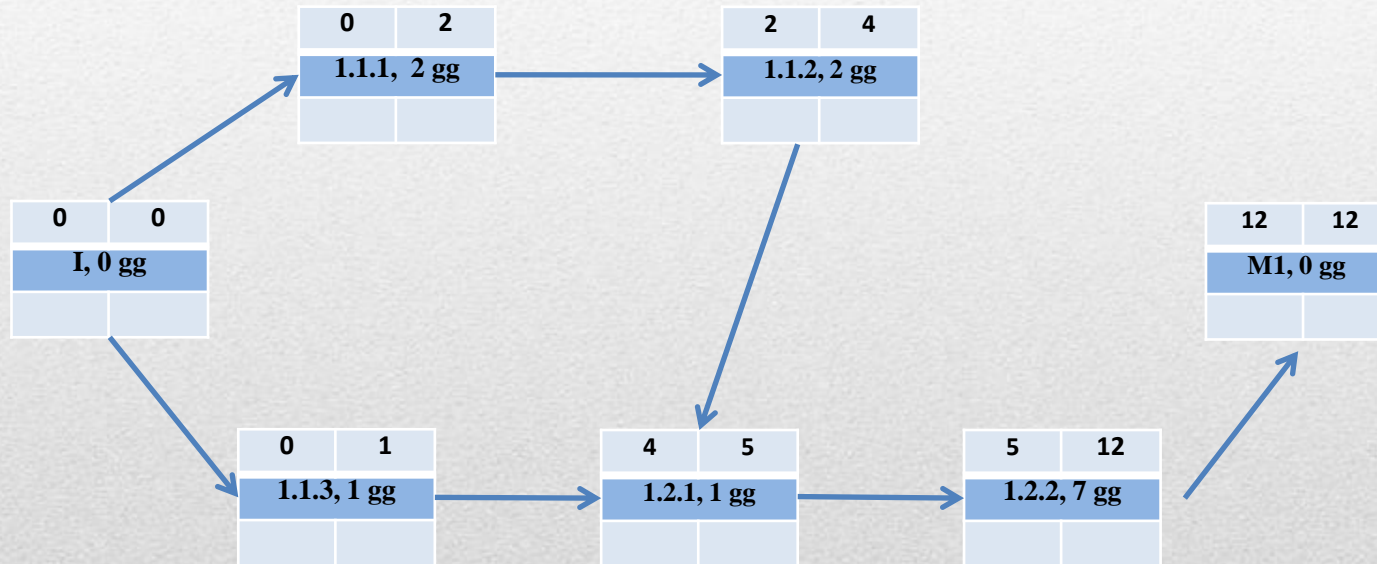

CPM: inizio_min e fine_min


Fine_max = Inizio_max (task successivo)

Inizio_max = Fine_max – durata_task

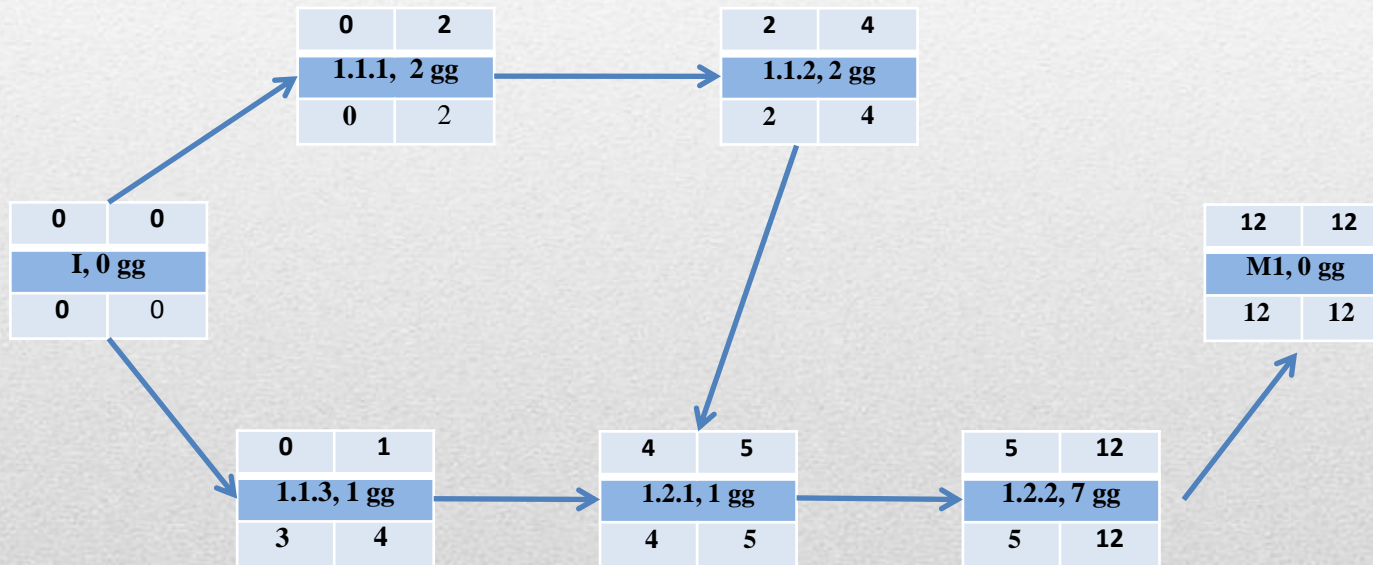

CPM: inizio_max e fine_max

Non si può ritardare! Si ritarderebbe tutto il progetto

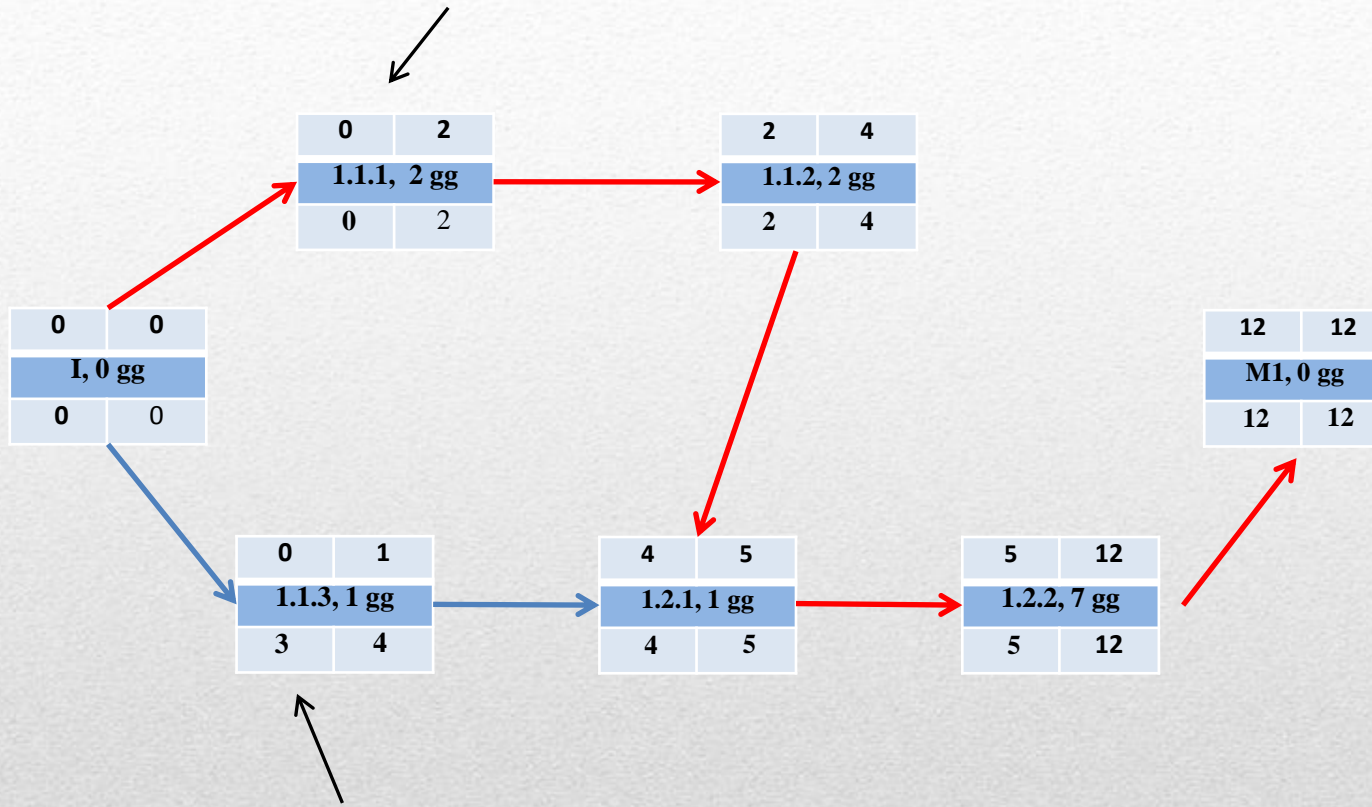

Anche se si inizia il 3° giorno, non si ritarda comunque la fine del progetto

Percorso critico
